

## RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA N° 036/2019-GPROJ-AGE

**E. E. E. M. FELISBELO JAGUAR SUSSUARANA DE SANTAREM-PARÁ**

**Data da Visita:** 16/11/2019

### Equipe AGE:

- Luis Fernando B. dos Santos - Assessor - GPROJ.
- Alessandro de Moraes Barros - Motorista.

### Acompanharam a Visita:

- Wanderley Figueira Garcia - Diretor da Escola - mat. 5337429/2.
- Cassandra Dea Diniz da Costa - Vice Diretora - mat. 5810159/2.

### **Introdução:**

Portarias AGE N° 345 e 346/2019-GAB de 11 de novembro de 2019 designou respectivamente os servidores Luis Fernando Bittencourt dos Santos, engenheiro civil, e Alessandro de Moraes Barros, motorista, para visita técnica aos municípios de Juruti e Faro e que se estendeu a visita técnica a escola supra citada em Santarém. No decorrer das diligências à escola foi emitido formulário de vistoria pela AGE, documento assinado pelo representante da AGE e pelo diretor da escola.

### **Relato:**

Em 16 de novembro de 2019 a AGE procedeu a visita as dependências da EEEM Felisbelo Jaguar Sussuarana, para averiguar se houve manutenção por parte da empresa LIDER nas dependências desta escola estadual, nos acompanhou o Sr. Wanderley Figueiredo Garcia diretor da escola e Cassandra Dea Diniz da Costa, para dar prosseguimento a visita.

---

Rua Domingos Marreiros n° 2001- Bairro: Fátima-CEP:66060-160 Belém-Pará  
Fone/Fax: (091) 3239-6476 Fone: (091) 3239-6477

E-mail: [auditoria@age.pa.gov.br](mailto:auditoria@age.pa.gov.br)

[www.age.pa.gov.br](http://www.age.pa.gov.br).

Na visita notamos que havia obra inacabada nas dependências da escola. Segue informações colhidas em entrevista com o diretor e informações contidas na placa da obra: Objeto: **Construção da Quadra Coberta da E. E. E. F. Felisbelo Jaguar Sussuarana**, onde o recurso oriundo do FNDE / MEC originou Contrato firmado entre a SEDUC e a empresa HERMES E HERMES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Ao custo total de R\$ 267.074,63 (duzentos e sessenta e sete mil setenta e quatro reais e sessenta e três centavos), tendo início das obras previsto para agosto de 2014 e prazo de execução previsto em 90 dias.

Visualizamos que, as obras de construção da quadra coberta não foram concluídas. E o que constatamos é o que segue abaixo:

**Serviços finalizados:** fundações, pilares metálicos e estrutura de cobertura.

**Serviços não finalizados:** até o momento não se pode mesurar os serviços restantes para conclusão desta obra devido ausência de dados para análise.

**Sobre a Empresa Hermes:**

A empresa Hermes e Hermes Construções e Serviços Ltda. CNPJ nº 17.141.085/0001-20, situada no endereço: PA 431 km 12 s/n, bairro Comunidade Palhal, CEP: 68.129-000, Mojuí dos Campos/PA, com contrato junto a SEDUC para as obras de construção da quadra de esportes na citada escola, com início dos serviços previsto para agosto de 2014, informações dada pelo Diretor da Escola (registro em vídeo) **as obras iniciaram no mês de setembro de 2014 e foram até novembro de 2014**, vale ressaltar ainda que o piso da quadra encontrado onde as fundações e estrutura metálica foram executados são de construção já existente e que a empresa HERMES não fez qualquer intervenção neste piso de

quadra. Passados 5 (cinco) anos do contrato firmado entre SEDUC e empresa HERMES esta obra não foi concluída.

### Conclusão:

Embasado no exposto neste relatório informamos que as obras referentes ao contrato SEDUC/HERMES se encontram paralisadas, e até a data da visita da AGE, 16 de novembro de 2019 esta obra chega a 5 anos sem a finalização dos serviços.

O presente relatório de vistoria deverá ser encaminhado para a SEDUC, bem como deverá ser requerido o processo referente ao Contrato, juntamente com a relação de notas fiscais emitidas pela empresa HERMES, os boletins de medição e os termos aditivos, se houver, referentes a obra de Construção da Quadra Coberta da E. E. E. F. Felisbelo Jaguar Sussuarana, em Santarém, Pará, possibilitando análise conclusiva por parte desta AGE.

Belém, 21 de novembro de 2019.

### ELABORADO POR:

Luis **Fernando** B. dos **Santos**  
Assessor - GPROJ  
Auditoria Geral do Estado-AGE

### CIENTE:

ILTON **GIUSSEPP** STIVAL **MENDES** DA ROCHA LOPES DA SILVA  
Auditor Geral do Estado

Registro Fotográfico:

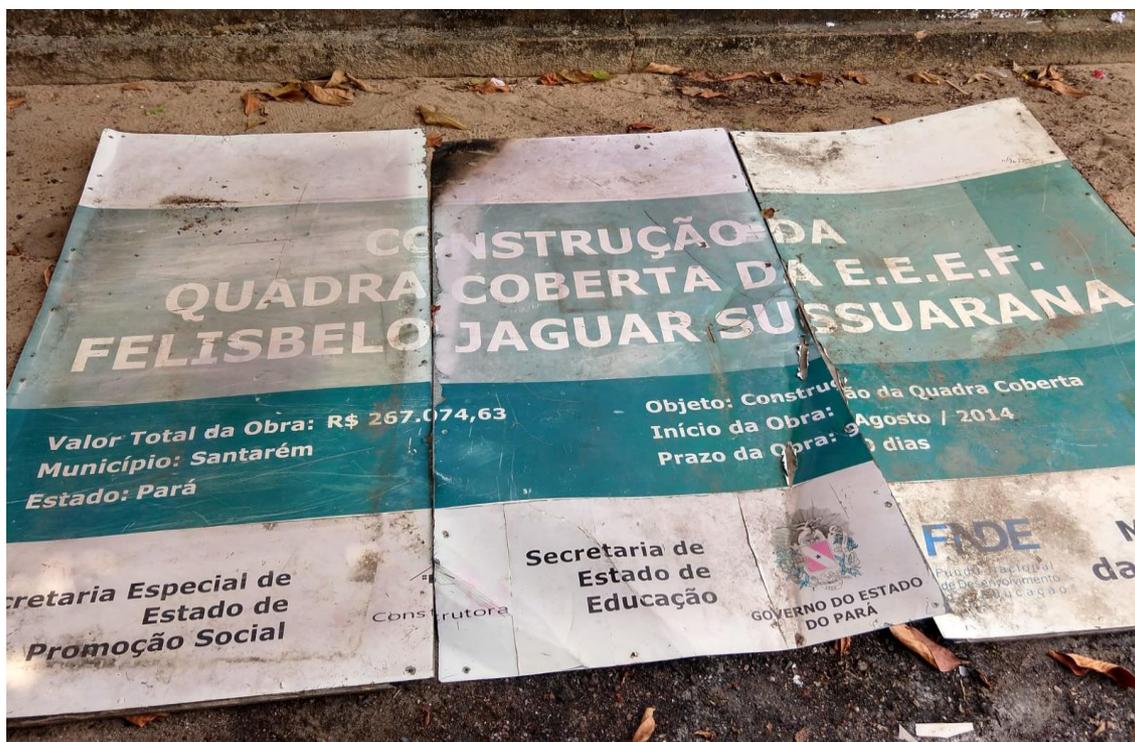


Imagem 01 - Placa da Obra



Imagem 02 - Vista da quadra

Rua Domingos Marreiros nº 2001- Bairro: Fátima-CEP:66060-160 Belém-Pará

Fone/Fax: (091) 3239-6476 Fone: (091) 3239-6477

E-mail: [auditoria@age.pa.gov.br](mailto:auditoria@age.pa.gov.br)

[www.age.pa.gov.br](http://www.age.pa.gov.br).



**Imagem 03** - Vista da estrutura com Equipamentos sucateados



**Imagem 04 e 05** - Piso da quadra já existente, deteriorado.
